



EFFICIËNT CONTROLEREN EN INSPECTEREN

INSPECTIEPORTAL

Bijlage Afwijkingen

Rapportnummer : 1005

Dossier :12345/1005
Rapportage datum :24-10-2013
Inspectie datum :15-10-2013
Rapportstatus :Concept
Pagina : 1 van 2



Bijlage afwijkingen:

bij rapportnummer: 1005

168/1005/2

Locatie: Hoofdgebouw - 1e verdieping - Gang Test
Risico A


Het typeplaatje van verschillende componenten is niet afleesbaar, er zijn stickers op de betreffende componenten aangebracht.

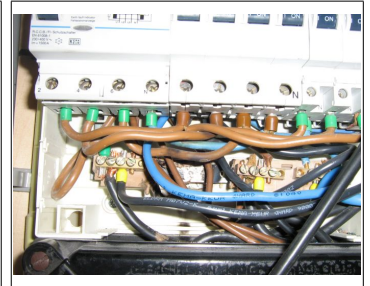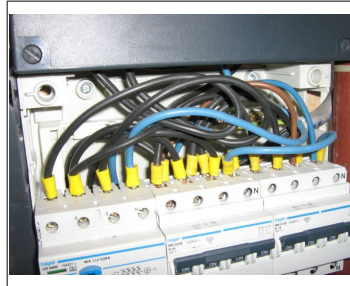

168/1005/4

Locatie: Hoofdgebouw - Begane grond - Elektrische bedrijfsruimte HVK

Diverse componenten zijn niet benoemd op de behuizing.

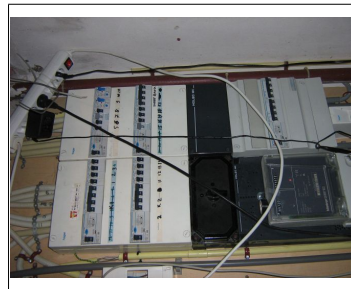

168/1005/5

Locatie: Hoofdgebouw - 3e verdieping - Keuken OVK Keuken

Op de aardrail is een aansluiting niet deugdelijk uitgevoerd, er is geen gebruik gemaakt van adereind bescherming.

